



臺中市政府水利局

TAICHUNG CITY GOVERNMENT WATER RESOURCES BUREAU

太平區

- 農路野溪及水土保持維護改善
- 河川區域排水改善、整治、清淤及維護



農路野溪及水土保持維護改善工程

施工前



施工中



施工後



太平區頭汴里北田路支線石荳湖農路改善工程

位置: 太平區頭汴里

工程內容: 新建重力式擋土牆

經費: 185仟元整

完工日期: 102年6月完工

效益: 以防止沖刷溝底及邊坡造成土壤流失，便於農村建設及保障農民安全，改善農村道路品質，提升農村生活環境。



農路野溪及水土保持維護改善工程

施工前



施工後



太平區黃竹里德利路168號前坑溝改善工程

位置: 太平區黃竹里

工程內容: 新建護岸、新建固床工5座、新建靜水池1座

經費: 584仟元整

完工日期: 102年6月完工

效益: 以防止沖刷溝底及邊坡造成土壤流失，便於農村建設及保障農民安全，改善農村道路品質，提升農村生活環境，整治後之坑溝更具功效，防止溝床之縱向沖蝕，穩定溝身，並可保全人民財產安全。

農路野溪及水土保持維護改善工程



太平區勤益里老鼠崎農路改善工程

位置: 太平區勤益里

工程內容: 新建懸臂式擋土牆、重力式擋土牆、塊狀護欄15個、PC路面鋪設

經費: 526仟元整

完工日期: 102年6月完工

效益: 新建擋土牆及路面鋪設，以防止沖刷溝底及邊坡造成土壤流失，便於農村建設及保障農民安全，改善農村道路品質，提升農村生活環境，整治後之坑溝更具功效，防止溝床之縱向沖蝕，穩定溝身，並可保全人民財產安全。

施工前

施工中

施工後

農路野溪及水土保持維護改善工程



太平區坪林里龍繩掛農路改善工程

位置: 太平區坪林里

工程內容: 新建重力式擋土牆、PC路面鋪設、新建懸臂式擋土牆

經費: 1,270仟元整

完工日期: 102年6月完工

效益: 農路路面鋪設路面，適於大型農機運作，便利農產品運銷，有助於農業機械化之推廣及農產品品質保鮮，新建擋土牆，以防止沖刷溝底及邊坡造成土壤流失，便於農村建設及保障農民安全。

施工前



施工中



施工後



農路野溪及水土保持維護改善工程

太平區黃竹里溪南橋等農路欄杆改善工程

位置:太平區黃竹里溪南橋等

工程內容:溪南橋護欄改善、大湖橋護欄改善、民生橋護欄改善、福安橋護欄改善

經費: 1637仟元整

完工日期: 102年6月10日完工

效益: 保全坑溝兩側居民及用路安全, 排水順暢, 有助於農民福利之增進, 鞏固農民從農之意願, 使其農村經濟更具發展並有一個更具安全的居住環境。



施工前



施工中



施工後

農路野溪及水土保持維護改善工程

太平區黃竹里車籠埔段10-3地號坑溝改善工程

位置:太平區黃竹里車籠埔

工程內容:新建護岸、靜水池1座、新建跌水工1座、新建排水溝

經費:1462仟元整

完工日期:102年6月10日完工

效益:興建後之排水溝,可改善排水順暢,並降低居民住家安全及減少公共設施之維護費。整治後之坑溝更具功效,防止溝床之縱向沖蝕,穩定溝身,並可保全人民財產安全。



施工前



施工中



施工後



農路野溪及水土保持維護改善工程



施工前



施工中



施工後



太平區大興里七瑤農路上邊坡等二處改善工程

位置:太平區大興里(G工區)


工程內容:新建重力式擋土牆(含L型溝)

經費: 361仟元整

完工日期: 102年6月10日完工

效益: 整治後之坑溝更具功效, 防止溝床之縱向沖蝕, 穩定溝身, 改善排水順暢, 並可保全人民財產安全。

農路野溪及水土保持維護改善工程

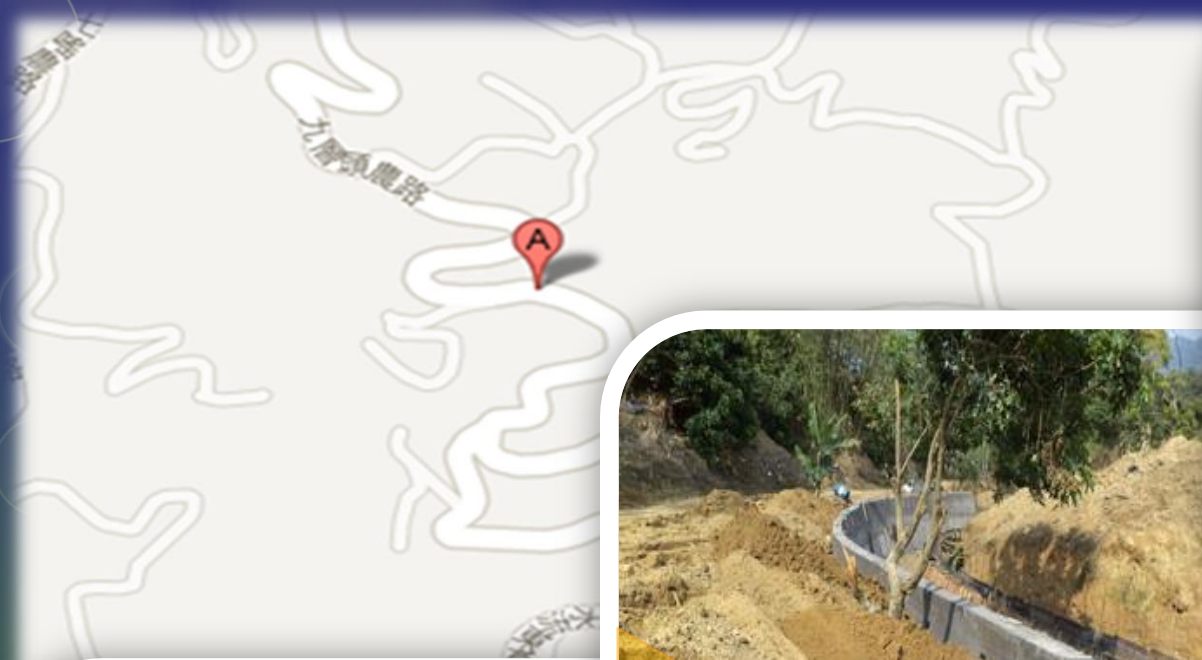

施工後



施工中



施工前

太平區大興里七瑤農路上邊坡第二處改善工程

位置:太平區大興里(H工區)

工程內容:新建護岸、新建固床工8座、新建擋土牆、新建路緣石、新建靜水池1座

經費: 361仟元整

完工日期: 102年6月完工

效益: 整治後之坑溝更具功效, 防止溝床之縱向沖蝕, 穩定溝身, 並可保全人民財產安全。

農路野溪及水土保持維護改善工程

施工前



施工中



施工後



太平區東汴里南國巷路面修復工程

位置:太平區東汴里南國巷

工程內容:AC路面修補

經費:1,003仟元整

完工日期:102年6月完工

效益:改善後之農路更具功效,邊坡更形穩固,排水更順暢,有助於農民福利之增進,鞏固農民從農之意願,使其農村經濟更具發展並有一個更具安全的居住環境。



農路野溪及水土保持維護改善工程

施工前



施工中



施工後



太平區東和里咬人狗坑道路下邊坡崩塌改善工程

位置:太平區東和里

工程內容:潛壩2座(含側牆、水墊及尾檻)、埋設涵管

經費:1741仟元整

完工日期:102年6月完工

效益:整治後之坑溝更具功效,防止溝床之縱向沖蝕,穩定溝身,並可保全人民財產安全,確保河道避免沖刷掏深,並保護邊坡崩塌,在大雨來臨時更具安全性,可減少農民損失及下游災害並減少公共設施之維護費。



農路野溪及水土保持維護改善工程

施工前



施工中



施工後



太平區興隆里新坪農路旁坑溝改善工程

位置:太平區興隆里

工程內容:兩側護岸、跌水工3座、固床工2座、擋土牆、箱涵、AC修復

經費:1475仟元整

完工日期:102年6月完工

效益:興建後之護岸更具功效,確保河道避免沖刷掏深,並保護邊坡崩塌,在大雨來臨時更具安全性,可減少農民損失及下游災害並減少公共設施之維護費。



農路野溪及水土保持維護改善工程

施工前



施工中



施工後



太平區頭汴里內險農路上邊坡改善工程

位置: 太平區頭汴里

工程內容: 既有擋土牆加高及落石防護欄、新建排水溝、新建集水井1座、新建截水溝、AC路面破損修補

經費: 1392仟元整

完工日期: 102年7月16日完工

效益: 農路為北田路支線，完工後可保全用路人安全。

河川區域排水改善及整治工程

施工位置圖



施工前



施工中



施工後

區里別

太平區興隆里

工程名稱

太平區興隆路一段63號後方共同排水護岸復建工程

完成日期

102年10月

工程內容

護岸修復 L=30m

工程經費

304 仟元

工程效益

保護兩側居民及公共設施範圍達 1,500m²

河川區域排水103年度清淤及維護計畫

施工位置圖



清淤前



清淤中



清淤後

區里別

太平區

工程名稱

太平區坪林排水清淤、雜草清除及河道整理

完成日期

103年4月27日

工程內容

河床整理W=8m L=3100m

工程經費

236仟元

工程效益

保護兩側居民及農田範圍達24,800m²

河川區域排水103年度清淤及維護計畫

施工位置圖



施工前



施工中



施工後

區里別

太平區勤益里

工程名稱

太平區勤益里坪林路49-5號(願西精舍)坪林排水基礎補強

完成日期

103年4月15日

工程內容

基礎補強 L=60m

工程經費

394仟元

工程效益

提高護岸結構安全

河川區域排水103年度清淤及維護計畫

施工位置圖



區里別

太平區永隆里

工程名稱

太平區永隆里光德路七星排水護岸加高及清理

完成日期

103年4月15日

工程內容

護岸加高 L=192.5m H=1.5m

工程經費

1,416仟元

工程效益

保護兩側民地免受淹水
